

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

ACTA No	005	TEMA	Comité técnico – Contrato 27 INNOVACIÓN EDUCATIVA	D	M	A
				08	04	2022

LUGAR	PRESENCIAL
HORA	3PM
OBJETIVO	Analizar la ampliación del contrato y modificación de forma de pago, según los inconvenientes presentados durante la ejecución del proyecto en el Departamento de Chocó

PARTICIPANTES

COMITÉ TECNICO - EDUCATEC

- ANDRES CHACÓN – COORDINADOR TECNICO
- WILMER COPETE – ASESOR DE INNOVACIÓN
- GABRIEL MORENO – ASESOR DE INNOVACIÓN
- ANGEL REYES – ASESOR DE INNOVACIÓN

CONTRATISTA – PARQUESOFT BOGOTÁ

- SANDRA RIVAS – COORDINDORA TECNICA PSB

ORDEN DEL DÍA

1. Generalidades de la reunión
2. Presentación de avance del contrato
3. Socialización de dificultades en ejecución
4. Conclusiones y decisiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Generalidades de la reunión

Andrés Chacón como coordinador técnico da inicio a la reunión, indicando que es urgente tomar decisiones frente al contrato en ejecución No 27 de 2022. Debido a que se ha informado por parte del ejecutor Parquesoft Bogotá las diferentes dificultades en términos de orden publico, conectividad y conexión energética. Que dificultan el desarrollo de las actividades y mas específicamente la formación virtual con los docentes. Por lo tanto, da el paso a la Dra Sandra Rivas para que presente el avance del contrato a la fecha.

2. Presentación de avance del contrato

La Dra Sandra Rivas presenta el informe de ejecución del contrato No 27 de 2022 hasta el mes de Marzo, indicando que dentro de la ejecución se han presentado muchos logros con respecto a los procesos de innovación, pero la ejecución se ha complicado debido alas diferentes problemáticas que se han tenido en el departamento. Con esta introducción presenta la siguiente información:

Informe de acompañamiento en innovación educativa para los docentes:

Actividad	Paquete de trabajo	Meta	Soporte	Avance Final	
				Avance acumulado	% Acu
Visita 1 Darién	Asesoría en innovación	30 docentes atendidos en visita 1	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	35 docentes atendidos visita 1	100%
Visita 1 San Juan	Asesoría en innovación	50 docentes atendidos en visita 1	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	48 docentes atendidos visita 1	96%
Visita 1 Atrato	Asesoría en innovación	100 docentes atendidos en visita 1	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	82 docentes atendidos visita 1	82%
Visita 1 Baudó	Asesoría en innovación	10 docentes atendidos en visita 1	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	18 docentes atendidos visita 1	100%
Visita 1 Pacifico	Asesoría en innovación	20 docentes atendidos en visita 1	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	17 docentes atendidos visita 1	85%

Nota: Esta visita fue desarrollada en forma de un taller de innovación educativa en las 21 instituciones involucradas en el proyecto. Faltaron 4 docentes inscritos en la región del Darién (Riosucio y Bojayá), se dio la ausencia de 10 docentes en la región del San Juan (Istmina, Tadó, Condoto, Certeguí y Unión Panamericana), en la región del Atrato no asistieron 28 docentes y en la región del pacifico faltaron 5 profesores.

Actividad	Paquete de trabajo	Meta	Soporte	Avance Final	
				Avance acumulado	% Acu
Visita 2 Darién	Asesoría en innovación	30 docentes atendidos en visita 2	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	25 Docentes atendidos visita 2	83%
Visita 2 San Juan	Asesoría en innovación	50 docentes atendidos en visita 2	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	44 Docentes atendidos visita 2	88%
Visita 2 Atrato	Asesoría en innovación	100 docentes atendidos en visita 2	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	72 Docentes atendidos visita 2	72%
Visita 2 Baudó	Asesoría en innovación	10 docentes atendidos en visita 2	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	11 Docentes atendidos visita 2	100%
Visita 2 Pacífico	Asesoría en innovación	20 docentes atendidos en visita 2	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	18 Docentes atendidos Visita 2	90%

Nota: por motivos de paro armado en las subregiones del San Juan y Darién se aplazaron las visitas 2 y 3 hasta el primero de marzo de 2022. La visita 2 contemplo, una atención personalizada donde los docentes agendaban el horario en el cual podían ser atendidos por el experto en innovación, la programación de estas citas fue realizada por los enlaces y logísticos del proyecto y el tiempo de atención correspondió desde 30 minutos hasta 2 horas, considerando las necesidades de cada docente frente a la consolidación de su ficha de proyecto definiendo aspectos como: problema o necesidad, arquetipo, idea innovadora, propuesta de valor y recursos necesarios.

Con relación a la primera visita,

- En la subregión del **San Juan**, los municipios de Condoto y Certeguí, presentaron la ausencia de 1 docente, Aunque el municipio de Certeguí en cuanto a participación ha sido bastante crítico, por encontrarse demasiado ocupados en otras actividades y estar en proceso de transición por cambio de rector.
- En la subregión del **Atrato**, los municipios Carmen de Atrato y Quibdó (IE. Isaac Rodriguez y IEFEM), presentaron disminución de 3 y 1 docentes debido a la falta de tiempo para dedicar al proyecto e inconformidad con la metodología de trabajo y el tiempo asignado para la misma.
- En la subregión del **Darién**, en los municipios de Riosucio y Bojayá mostraron una baja considerable, con relación a la participación de los docentes en las visitas 6, 2 y 2 docentes corresponden al número de docentes de las instituciones: IE Nuestros esfuerzos, IE Antonio Ricauter y IE cesar Conto, que no participaron en esta visita.
- En la subregión del **Baudó**, la participación aumento, uniéndose 1 docente más al proceso.
- En la Subregión del Pacífico, la participación d ellos docentes fue estable en IE Normal Santa Terecita y Aumento, con la participación de 1 docente en la IE Luis Lopez de Mesa.

Actividad	Paquete de trabajo	Meta	Soporte	Avance Final	
				Avance acumulado	% Acu
Visita 3 Darién	Asesoría en innovación	20 docentes atendidos en visita 3	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	26 Docentes atendidos en visita 3	100%
Visita 3 San Juan	Asesoría en innovación	50 docentes atendidos en visita 3	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	45 Docentes atendidos en visita 3	90%
Visita 3 Atrato	Asesoría en innovación	100 docentes atendidos en visita 3	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	74 Docentes atendidos visita 3	74%
Visita 3 Baudó	Asesoría en innovación	10 docentes atendidos en visita 3	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	12 Docentes atendidos visita 3	100%
Visita 3 Pacifico	Asesoría en innovación	20 docentes atendidos en visita 3	Registro Fotográfico Asistencia Actas Agenda Fichas de proyecto	20 Docentes atendidos visita 3	100%

Nota: por motivos de paro armado en las subregiones del San Juan, Atrato (Rio Quito y Carmen de Atrato) y Darién se aplazaron las visitas 2 y 3 hasta el 21 de febrero, 3 y 4 de marzo de 2022. La visita 3 contemplo, una atención personalizada donde los docentes agendaban el horario en el cual podían ser atendidos por el experto en innovación, la programación de estas citas fue realizada por los enlaces y logísticos del proyecto y el tiempo de atención correspondió desde 30 minutos hasta 2 horas, al considerar las necesidades de cada docente, se realizó un refuerzo del taller de innovación realizado en la visita 1, tratando de apoyar a docentes que participaron por primera vez en el proceso; además, se dio fomento a la creatividad, permitiendo que los docentes plantearan y exploraran varias alternativas tecnológicas que les ayudaran a solucionar el problema o subsanar la necesidad identificada en su quehacer docente. Además, se fortaleció el planteamiento de la ficha de proyecto (acotando las ideas de innovación) definiendo aspectos como: problema o necesidad, arquetipo, idea innovadora, propuesta de valor y recursos necesarios.

Con relación a la primera y segunda visita,

- En la subregión del **San Juan**, los municipios de Condoto y Certeguí, presentaron la ausencia de 1 docente, Pero se mantiene la cantidad on relación a la segunda visita. En Unión Panamericana aumenta la participación con 1 docente. El municipio de Certeguí, continúa presentando problemas de tiempo, interés y transición por cambio de Rector.
- En la subregión del **Atrato**, los municipios Carmen de Atrato y Rio Quito, presentaron constancia en cuanto a la participación de visita 2 y 3. Sin embargo, en Quibdó las IE: Isaac Rodriguez, IEFEM, Normal de Quibdó y María Claret, manifiestan inconformidad con los tiempos asignados para trabajar, debido a esto la disminución en su participación es notable (se incluye tabla de relacionamiento de asistencia).
- En la subregión del **Darién**, en los municipios de Riosucio y Bojayá se mantuvieron constantes, con relación a la cantidad de docentes participantes en visita 2 y 3.
- En la subregión del **Baudó**, la participación aumento, uniéndose 1 docente más al proceso.
- En la Subregión del Pacifico, la participación d ellos docentes aumento en la IE Normal Santa Terecita y disminuyo, en la IE Luis Lopez de Mesa.

Informe de formación en innovación educativa para los docentes:

LUGAR DE EJECUCIÓN		SESIONES DIPLOMADO INNOVACIÓN EDUCATIVA						
IE	MUNICIPIO	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
IE MARIA AUXILIADORA	CONDOTO	213	1	0	1	2	1	2
IE NORMAL SUP SAN PIO X	ISTMINA		13	11	10	10	9	12
IE TECNICO AGROAMBIENTAL	TADO		3	8	6	4	8	9
IE SAN JOAQUIN	U. PANAMERICANA		3	3	3	3	3	1
IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- PUERTO MELUK	MEDIO BAUDO		5	2	4	4	4	3
IE MATIAS TRES PALACIOS	CERTEGUI		3	4	4	3	2	4
IE BERNARDINO BECERRA RODRIGUEZ	RIO QUITO		6	6	8	9	8	7
IE LUIS LOPEZ DE MESA	BAHIA SOLANO		4	5	7	5	7	6
IE CESAR CONTO	BOJAYÁ		6	4	8	6	7	7
IE NUESTROS ESFUERZOS	RIOSUCIO		2	2	4	1	2	1
IE NORMAL SUPERIOR SANTA TERESITA	BAHIA SOLANO		2	1	3	2	2	3
IE ANTONIO RICAURTE	RIOSUCIO		1	3	4	0	4	2
IE CORAZON DE MARIA	EL CARMEN		1	2	3	3	2	3
IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ	QUIBDÓ		4	4	5	6	6	7
IE FEM DE ENSEÑANZA MEDIA	QUIBDÓ		6	5	5	5	8	7
I.E. NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO	QUIBDÓ		5	4	6	4	9	9
IE ARMANDO LUNA ROA	QUIBDÓ		3	3	4	4	4	6
IE NORMAL SUPERIOR MANUEL CAÑIZALEZ	QUIBDÓ		1	1	4	4	3	3
I.E. ANTONIO MARIA CLARET	QUIBDÓ		2	5	7	8	5	5
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DE QUIBDO	QUIBDÓ		5	5	9	8	9	4
I.E. TECNICA INTEGRADO CARRASQUILLA INDUSTRIAL	QUIBDÓ		1	1	3	3	5	4
TOTAL		77	79	108	94	108	105	

Finalizando la presentación se da paso a las dificultades que se han tenido en la ejecución de las actividades, entre estas son las que han dificultado el cumplimiento de la meta del diplomado en innovación educativa con los 210 docentes formados.

3. Socialización de las dificultades presentadas

Dentro de las dificultades presentadas se asocian a problemáticas en orden público, energía eléctrica y dificultades de conectividad en el departamento. Se enumeran de la siguiente manera por parte de la coordinadora técnica de Parquesoft Bogotá

- 20 febrero de 2022 - Paro armado por el grupo al margen de la ley denominado ELN, del 23 de febrero hasta 26 de febrero en el Departamento de Chocó.



COMUNICADO PÚBLICO

Saludo al pueblo colombiano.

Contra Duque y su mal gobierno el Ejército de Liberación Nacional decreta Paro Armado en todo el territorio nacional. Se llevará a cabo a partir de las 6:00 horas del 23 de febrero, hasta las 6:00 horas del 28 de febrero de 2022.

La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias.

Recomendamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad.

Las autoridades no podrán responder por las afecciones que les pueda suceder a los vehículos que desacaten la orden de paro.

Se reanudará el movimiento de vehículos luego de las 6:00 horas del 28 de febrero.

Fuera Duque y su mal gobierno.

¡COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES!

¡NI UN PASO ATRÁS... LIBERACIÓN O MUERTE!

DIRECCIÓN NACIONAL

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL

20 de febrero 2022

Por seguridad del equipo de trabajo se restringieron los viajes a los municipios para el desarrollo de la segunda y tercera visita de innovación educativa, por lo cual modifiqué el cronograma.

- 24 de Febrero de 2022 – Ampliación del paro armado por el grupo al margen de la ley denominado ELN, del 23 de febrero hasta 28 de febrero en el Departamento de Chocó.



COMUNICADO PÚBLICO.

SALUDO AL PUEBLO COLOMBIANO.

En vista de que muchas poblaciones desacataron nuestro orden nacional de paro y no entendieron la razón de este llamado, a rechazar todas las malas acciones ejecutadas por este gobierno y a su vez decidieron tomar estas órdenes impartidas por el ejército de liberación nacional como un juego, haciendo caso omiso y realizando actividades que no debían ejercer el ejército de liberación nacional **DECRETA LA EXTENSIÓN DEL PARO ARMADO** que inició el día 23 de febrero del año 2022 desde las 6:00 AM hasta el día lunes 28 de febrero del año 2022 hora 6:00 A.M.

Resaltando que esta vez no serán tomadas nuestras acciones como **Diversión**. No respondemos en absoluto por lo que pueda suceder a todo aquel que no cumpla con nuestras órdenes impartidas por el estado mayor del ejército de liberación nacional.

Quedan prohibidas todas las actividades comerciales, estudiantiles, así como el transporte de pasajeros fluvial y terrestre y mercancías, tanto en horas del día como de la noche debido a que no tenemos en cuenta lo que se les soltó.

Resaltamos que **No** nos hacemos responsables por la integridad de aquellos que después de las 6:00 P.M se encuentren fuera de sus viviendas ejerciendo actividades comerciales o distintas a las ordenes impartidas. Y mucho menos Movilizando por el territorio Nacional.

Quedan prohibidos los sitios que después de las 6:00 P.M realizan actividades de **espectáculos de licor como Bares, Discotecas, Billares, tabernas, prostíbulos** etc. el ejército de liberación nacional decreta **CERRAR TOTAL** en todo el territorio Colombiano y más aún donde nuestras tropas hacen presencia, si creen que estamos jugando atrévase a hacer lo contrario a lo que se les ordena.

La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias

Recomendamos a la población en todo el territorio colombiano hacer caso y mantenerse en sus viviendas nadie se hará responsable por las consecuencias que puedan suceder.

FUERA DUQUE Y SU PÉSIMO GOBIERNO.

COLOMBIA PARA LOS TRABAJADORES

¡NI UN PASO ATRÁS LIBERACIÓN O MUERTE!

DIRECCIÓN NACIONAL


EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL.

24 de febrero 2022.



Por seguridad del equipo de trabajo se restringieron los viajes a los municipios para el desarrollo de la segunda y tercera visita de innovación educativa, por lo cual modifiqué el cronograma.

- 8 de Marzo de 2022 – Afectaciones de servicios de internet por parte del proveedor departamental Azteca, esto relacionado por el corte de fibra el cual dejo al departamento desconectado por 3 días.
- 18 – 19 – 20 y 21 de Abril de 2022 – Afectaciones de servicios de internet por parte del proveedor departamental Azteca, el cual fue noticia nacional.

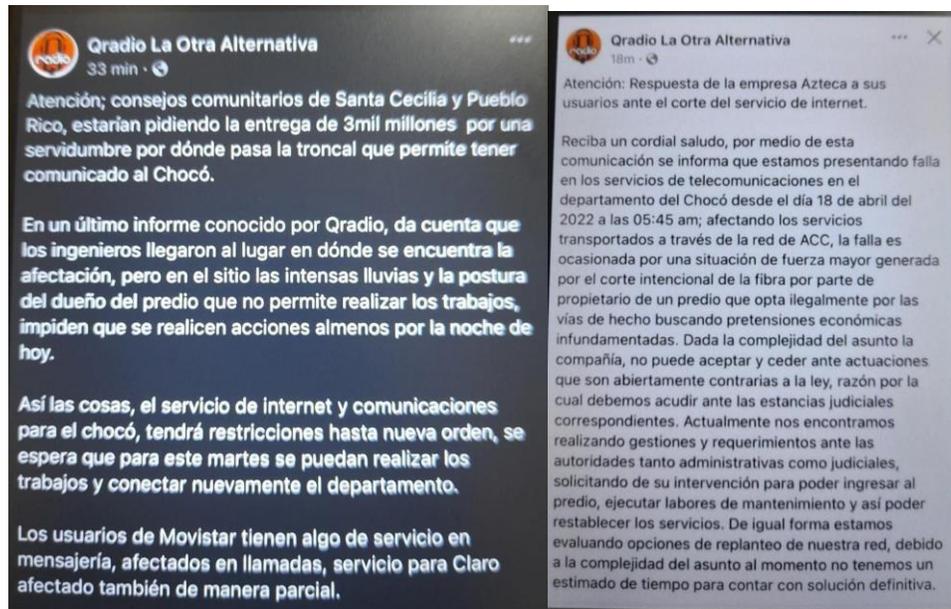

Debido a estas problemáticas en conectividad, se cancelaron las sesiones 4 y 5 del diplomado de innovación

- 25 de Abril de 2022 – Afectaciones por cortes de energía en el departamento, este sucedió entre 23 al 25 de Abril de 2022.

ATENCIÓN

Apreciado usuario, **DISPAC S. A. E.S.P.** Se permite informar que el día

Lunes 25 de abril de 2022

Por estado de emergencia se realizará la recuperación de la caída de media tensión del circuito rural SQ-204 en la subestación Huapango en estado de falla, debido a eventos ocurridos en la noche del sábado 23 de abril, afectando la continuidad del servicio de los siguientes usuarios: Usuarios del circuito rural (SQ204) entre las 4am a 12 pm, usuarios ubicados en: Municipios: Yuto, Lloró. **Corregimientos:** Tutunendo, Guadalupe, ocho comunidades indígenas desde el 21 hasta el 15, San José de Purú, San Martín de Purú, San Mateo de Motolód, Real de Tanando, Tanando, la Troje, La Playa, la Molana, Samuindo, Borz Jigüta, Arenal, Boroato, Tumutumbú, Villa Claret, Puerto Moreno, Gerbacó, Nipuró, El Galano y Pacurita. **Barrios:** Los Angeles, sector Condoto, Turpiales, Obapo, Villa Country, Uribe Vélez, Villa del Carmen, Divino Niño, sector los paisas; Piñal Caraho, Virgen del Carmen, urbanización las 1500, Bosques de la Platina **Usuarios de los circuitos Médranos (SM-201, SM-202 y SM-203)** entre las 4 am a 8 am, usuarios ubicados en: Barrios: Los Álamos, Huapango, Kennedy, Tomas Pérez, Silencio, Alameda por Carrera 9, Chambum, La Aurora, Pandeyuca, Yesquita San Vicente, Médrano con todos sus sectores, viento libre, las Mercedes, las palmas, Horizonte, Alfonso López, Playita, Niño Jesús, Palenque, Jardín con todos sus sectores, Tambo, zona minera, los Castillos I y II, Suba 1, Suba 2, mirador de Suba, Cascorba, El Guaje, Citará, las terrazas, Av. Bahía Solano. **Corregimientos:** Rio Quito (La Soledad, San Isidro, La Loma, Villa Conto, Chigvigidó y Chiguarandó) **Instituciones:** Batallón Manosalva, Basurero Marmolejo, Hospital Imael Roldán, clínica de especialistas Virgen María, SENA, Clínica Santiago, Pro social, Universidad UTEC, Universidad FUDLA, EPQ Bocatoma "Acueducto" Cárcel Anayansi, oficina ppal. Dispac, Contraloría.

Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la subestación Huapango y prestar un servicio de calidad. DISPAC ofrece disculpas a los usuarios que se verán afectados.

MEJORAS PROGRAMADAS

Apreciado usuario, **DISPAC S. A. E.S.P.** Se permite informar que los días

Sábado 23 de abril

Se realizarán mejoras programadas consistentes en Cambio de redes en los circuitos de media tensión en la ciudad de Quibdó en la vía principal del Barrio Médrano desde la escuela anexa al carrasquilla industrial, hasta la entrada del barrio horizonte; por tal razón se suspenderá el servicio de energía. A los usuarios ubicados en las siguientes zonas. **BARRIOS:** Médrano sector (el Progreso, Viento Libre, Avenida Froilán Trelles, El Piñal), Las Palmas, Simón Bolívar, Alfonso Lopez, Las Mercedes, El Horizonte. **INSTITUCIONES:** Universidad Tecnológica del Choco, Ancianato de Quibdó, Escuela Anexa al Carrasquilla Industrial, Clínica de especialistas del Choco (Médrano).

entre las 08:00 a 17:30 horas

Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad. DISPAC ofrece disculpas a los usuarios que se verán afectados.

Nota: Si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades, éstas podrán ser canceladas y/o aplazadas. Por norma de seguridad, las instalaciones deben considerarse energizadas permanentemente, el suministro podrá ser restablecido sin previo aviso.

#PASALAVOZ

dispac



MEJORAS PROGRAMADAS

Apreciado usuario, **DISPAC S. A. E.S.P.** Se permite informar que los días

Domingo 24 de abril

Se realizarán mejoras programadas consistentes en Cambio de redes en los circuitos de media tensión en la ciudad de Quibdó sobre la carrera 6 entre calles 31 y 34 (Huapango) por tal razón se suspenderá el servicio de energía. A los usuarios ubicados en las siguientes zonas. **BARRIOS:** Jucho Y Todos Sus Sectores, Zona Minera Y Todos Sus Sectores, Los Castillos Y Todos Sus Sectores, Obapo Y Todos Sus Sectores, Suba 1 y 2, Médrano Sector (San Francisco De Médrano, Divino Niño, Las Terrazas, Buena Vista, Bahía Vista), La Cascorba, Flores De Buenaflores Y Todos Sus Sectores, Gabi Y Todos Sus Sectores, Médrano sector (el Progreso, Viento Libre, Avenida Froilán Trelles), El Piñal del Médrano, Las Palmas, Simón Bolívar, Alfonso Lopez, Carrera 9 entre calles 24 y 26, vía principal de Médrano desde la calle 24 hasta el acueducto de Quibdó, Palenque, Niño Jesús y todos sus sectores, San Martín, la playita, las mercedes, Yesquita y todos sus sectores, san Vicente, Bahía Solano, Tomas Pérez y todos sus sectores, el silencio, carrera 7 entre calles 24 y 30, Julio Figueroa, Alameda reges Calle 26 entre carreras 4 y 9, calle 24 entre carreras 7 y 9, Fuente García Gómez, La Aurora, Menuto de Dios parte baja, los rosales parte baja, las mercedes parte baja, Carrera primera entre calles 20 y 24, carrera 4 entre calle 22 y 26, Calle 24 entre carrera 4 y 6, Calle 26 entre carrera 4 y 7, Calle 27 entre carrera 4 y 7, calle 28 entre carrera 4 y 7, calle 29 entre carrera 4 y 7, Purvenir y todos sus Sectores, Santo Domingo, Santa Ana, Las Américas, Los Angeles, La Esmeralda, La Cohanira, El Bosque, San Judas, Alameda Reyes Desde La Carrera 9 hasta Ochoan Pablo De Las Margaritas, carrera 10 entre calle 26 y 27, las margaritas, ministro de Dios. **LOCALIDADES:** La Soledad, Guayabalito, San Isidro, Boca De Palmadó, La Loma, Villa Conto, Chiguarandó, Chigvigidó. **INSTITUCIONES:** Batallón Manosalva Pérez, Clínica San Rafael, Colegio normal superior, Acueducto de Quibdó, Aguas del Anzo, Uselco la zona, playita y Gabi, Colegio Carrasquilla Industrial, Defensoría del pueblo, sede Principal de Dispac, Notaria Segunda, Bienestar Familiar, Fundación Santa Sofía De Añis, Contraloría Departamental, Cárcel Anayansi, Plaza de mercado, Codochocho, Alumbraza pública, unad, tribunal de justicia (instrumentos público), Centro Comercial El Caraho, Aeropuerto El Caraho, Biblioteca Del Centro Comercial (Arnoldo Palacios), Estación de Policía aeroportuaria, Casa De Encuentro, Colegio Santo Domingo Sávio, Hoger infantil Santa Ana, Escuela Santa Ana, colegio cuberto de Quibdó, colegio de bores, escuela Melvín John, escuela De la esmeralda.

entre las 08:30 a 10:30 y entre las 16:00 a 17:30 horas

Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad. DISPAC ofrece disculpas a los usuarios que se verán afectados.

Nota: Si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades, éstas podrán ser canceladas y/o aplazadas. Por norma de seguridad, las instalaciones deben considerarse energizadas permanentemente, el suministro podrá ser restablecido sin previo aviso.

#PASALAVOZ

dispac

4. Conclusiones y decisiones

Expuesto lo anterior por parte de la entidad contratista se solicita poder realizar un ajuste en la forma de pago del contrato con el fin de financiar las actividades del proyecto y cumplir con el alcance establecido. Indica que es importante aclarar que no se pide hacer el cambio de los pagos, sino, se solicita dividir el pago 2 en dos pagos para poder financiar las actividades.

Por otro lado, teniendo en cuenta el retraso que se ha presentado en el desarrollo de las actividades se ha modificado el cronograma del proyecto y por ende este cronograma supera el tiempo establecido por el contrato hasta el 11 de junio de 2022. Por lo tanto, después de dicha explicación el coordinador técnico del proyecto y supervisor del contrato indica que esta de acuerdo de las modificaciones del contrato y por ende se establece el ajuste de la siguiente manera:

4.1 Modificación de forma de pago

PAGO	TOTAL	%	DETALLE
<p>Primer Pago Anticipo: se pagará una vez perfeccionado, legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, para lo cual presentará el plan de inversión del anticipo y la cuenta de cobro respectiva.</p>	\$224,665,056	40,0%	<p>Se pagará una vez perfeccionado, legalizado el contrato y aprobadas las pólizas de garantía aportadas por el contratista, para lo cual presentará el plan de inversión del anticipo y la cuenta de cobro respectiva</p> <p>El plan de inversión debe contener los siguientes entregables: Amortización y legalización del anticipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (1) Aprobación del plan de formación y acompañamiento en innovación • (1) Metodología de formación y acompañamiento en innovación • (1) Evento de preparación de (5) facilitadores • Formación a (210) Docentes con mínimo (60) horas que correspondan a (48) horas virtuales y (12) horas de trabajo autónomo • (1) Una visita presencial a las (21) sedes educativas por parte de expertos en innovación • (1) una mesa de ayuda virtual funcionando
<p>Segundo Pago del contrato, Previa presentación de informe de actividades donde se evidencie la Factura correspondiente que soporte la ejecución de las actividades, pago de seguridad Social y certificación de cumplimiento por el supervisor</p>	\$112,332,528	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Formación a (110) Docentes cumplimiento de (60) que corresponden a (20) horas virtuales y (40) trabajo autónomo • (5) Visita presencial a las (21) sedes educativas por parte de expertos en innovación • (2) meses de mesa de ayuda virtual funcionando
<p>Tercer Pago del contrato, Previa presentación de informe de actividades donde se evidencie la Factura correspondiente que soporte la ejecución de las actividades, pago de seguridad Social y</p>	\$112,332,528	20%	<ul style="list-style-type: none"> • Legalización del anticipo del proyecto • Formación a (210) Docentes cumplimiento de (88) que corresponden a (48) horas virtuales y (40) trabajo autónomo • (7) Visita presencial a las (21) sedes educativas por parte de expertos en innovación • (3) meses de mesa de ayuda virtual funcionando

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

<p>certificación de cumplimiento por el supervisor</p>			
<p>Cuarto Pago del contrato, Previa presentación de informe de actividades que soporte la ejecución de las actividades, Soporte de , pago de seguridad Social y certificación de cumplimiento por el supervisor</p>	<p>\$ 112.332.528</p>	<p>20%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (10) visitas presenciales a las (21) sedes educativas por parte de expertos en innovación • Formación a (210) Docentes cumplimiento de (120) que corresponden a (48) horas virtuales y (72) trabajo autónomo • (4) mes de mesa de ayuda virtual funcionando en total (210) Proyectos de innovación educativa • (20) Prototipos seleccionados en fidelidad alta en innovación educativa

4.2. Modificación tiempo del contrato

Ampliación de 1 mes del tiempo de contrato según el cronograma presentado en la reunión

CONCLUSIONES

- Se aprueba bilateralmente según las incidencias presentadas en la modificación del contrato en la forma de pago y en el tiempo del contrato
- La modificación de la forma de pago garantiza el equilibrio financiero del contrato de forma proporcional a lo entregables del mismo

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA
<p>Notificación a la ordenadora del gasto y al área jurídica para la realización de la adición en tiempo y modificación de pago</p>	<p>-Supervisor y área jurídica EDUCATEC</p>	<p>20/04/2022</p>

	
<p>FIRMA ANDRES CHACÓN COORDINADOR TECNICO SUPERVISOR DEL CONTRATO UP HOLDING SAS - EDUCATEC</p>	<p>FIRMA SANDRA RIVAS COORDINADORA TECNICA PARQUESOFT BOGOTÁ</p>
	
<p>FIRMA GABRIEL MORENO ASESOR DE INNOVACIÓN UP HOLDING SAS - EDUCATEC</p>	<p>FIRMA WILMER COPETE ASESOR DE INNOVACIÓN UP HOLDING SAS – EDUCATEC</p>

	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>	<p>FECHA CREACIÓN: 05 DE OCTUBRE DEL 2021</p>
---	------------------------	---

 <p>1077448091</p>	 <p>cc80849687</p>
--	---

<p>FIRMA ANGEL REYES ASESOR DE INNOVACIÓN UP HOLDING SAS - EDUCATEC</p>	<p>FIRMA CRISTIAN FORESTIERI ROJAS DIRECTOR EJECUTIVO PARQUESOFT BOGOTÁ</p>
--	--

